Relatório Quinzenal de Atividades

Projeto STC Agiliza — Sprint 06 — 03/08/2026 a 14/08/2026

1. Identificação

Projeto	STC Agiliza
Número da Sprint	Sprint 06
Data de Início	03/08/2026 (segunda-feira)
Data de Término	14/08/2026 (sexta-feira)
Estagiário(s)	Enzo Frazão Vencio / Ariel Asafe Durans Rabelo

2. Objetivo da Sprint

Esta sprint teve como objetivo consolidar o front-end do MVP do Agiliza Transparência. O trabalho concentrou-se em concluir a migração para o modelo canônico de coleta institucional por Unidade Gestora, reorganizar a experiência de uso por perfil (Servidor STC, ponto focal e respondente) e editar as funcionalidades já existentes para refletir as decisões tomadas na apresentação do sistema à chefia, em 11/08. Em paralelo, a equipe separou os repositórios de front-end e back-end e definiu a fronteira de integração, deixando a base preparada para o início do desenvolvimento do back-end na próxima etapa.

3. Atividades Realizadas e Status

Atividade Realizada	Status	Responsável
Migração canônica do front-end para ciclo versionado, coleta institucional por UG e contribuição por pessoa e adjunta	Concluída	Enzo
Reorganização da experiência por perfil (Servidor STC, ponto focal e respondente): shell, navegação, hierarquia de tarefas e estados vazios	Concluída	Enzo
Refinamento das coletas por perfil, integração da identidade visual (monograma em login, navbar e favicon) e shell responsivo	Concluída	Enzo e Ariel
Apresentação do sistema à chefia (11/08) e consolidação das decisões: perfil único de Servidor STC, publicação automática e coordenação focal por UG	Concluída	Enzo
Edição das funcionalidades conforme as decisões da reunião: pré-validação de planilha, mínimos de anexos, imutabilidade após validação e prazo de cinco dias com duas prorrogações	Concluída	Enzo
Separação dos repositórios de front-end e back-end e definição da fronteira de integração, preparando o início do back-end	Concluída	Enzo
Execução do gate de qualidade do front-end: 11 testes do importador, 10 verificações estruturais, 458 testes comportamentais e 29 jornadas ponta a ponta	Concluída	Enzo

4. Dificuldades Encontradas

A sprint avançou conforme o planejado, mas três pontos exigiram tratamento específico:

- Ausência de um dos estagiários em 12/08 por problemas de saúde. A carga prevista para a sprint foi mantida com a redistribuição das horas nos demais dias do período.
- A versão mais recente do Tesauro apresentou ambiguidades de extração que impediram sua adoção direta. O catálogo utilizado em execução foi restaurado a partir da versão anterior e do mapeamento fornecido pela STC, preservando 49 objetos, 276 campos e 484 associações; a pendência permanece registrada para decisão conjunta.
- Alguns pontos institucionais continuam sem definição da STC, como o prazo de uma UG incluída depois do primeiro número SEI e o tratamento de pedido complementar. Foram registrados como questões em aberto, sem que a equipe presumisse solução.

5. Próximos Passos

Atividades previstas para a próxima sprint:

- Validar as telas do MVP junto à STC e às Unidades Gestoras, consolidando os ajustes de fluxo e de apresentação apontados na validação.
- Otimizar o código do front-end, com componentização, redução de duplicação e remoção de estilos sem uso.

- Iniciar o desenvolvimento do back-end da solução, a partir do contrato e da fronteira de integração já definidos.
- Integrar gradualmente o front-end aos serviços reais, substituindo o estado simulado no navegador à medida que os endpoints forem construídos.
- Fechar com a STC as questões institucionais ainda em aberto antes de implementá-las.

6. Lista de Frequência

Horas totais = soma dos turnos efetivamente trabalhados no dia. Local: Home office, Sede da STC ou Oxygeni Hub (CEUMA). Quando houve mais de um turno, o intervalo está descrito na última coluna.

Semana 1 — 03/08 a 07/08/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (03/08)	09:30	14:30	4h00	Home office + Sede STC	Intervalo 12:30–13:30 (deslocamento)
Terça (04/08)	09:00	14:30	5h00	Home office + Sede STC	Intervalo 11:30–12:00 (deslocamento)
Quarta (05/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quinta (06/08)	09:00	14:30	5h30	Sede STC	—
Sexta (07/08)	09:30	14:30	4h30	Home office + Sede STC	Intervalo 12:30–13:00 (deslocamento)

Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (03/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Terça (04/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quarta (05/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quinta (06/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Sexta (07/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—

Semana 2 — 10/08 a 14/08/2026

Funcionário 1 — Enzo Frazão Vencio

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (10/08)	14:00	17:30	3h30	Sede STC	—
Terça (11/08)	14:00	23:30	9h00	Oxygeni Hub (CEUMA) + Home office	Intervalo 17:00–17:30 (deslocamento)
Quarta (12/08)	—	—	—	—	Falta justificada — problemas de saúde
Quinta (13/08)	13:00	17:00	4h00	Sede STC	—
Sexta (14/08)	08:00	19:30	6h30	Home office	Intervalo 12:00–17:00


Funcionário 2 — Ariel Asafe Durans Rabelo

Dia	Chegada	Saída	Horas Totais	Local	Justificativa de Falta
Segunda (10/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Terça (11/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quarta (12/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Quinta (13/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—
Sexta (14/08)	08:00	12:00	4h00	Home office	—

Total de horas na sprint: 46h (Enzo); 40h (Ariel)

7. Registro Fotográfico

Registro das telas do MVP consolidado nesta sprint, nos perfis de respondente, ponto focal e Servidor STC, capturadas no ambiente de desenvolvimento.




Legenda 1: *painel de contribuição do respondente, com etapas, prorrogações e não ocorrência.*



Legenda 2: *validação institucional pelo Servidor STC, com decisão única por contribuição.*




Legenda 3: *área operacional do ponto focal em largura de 375 px, com a navegação recolhida.*



Legenda 4: *painel do respondente na mesma largura, evidenciando o shell responsivo entregue na sprint.*

8. Entregável Funcional

Front-end do MVP do Agiliza Transparência consolidado, com 16 telas de produto distribuídas entre acesso público, Servidor STC, ponto focal e respondente. A aplicação cobre a criação e a publicação de ciclos a partir do catálogo oficial, a distribuição das coletas por Unidade Gestora, a contribuição do respondente com planilha e anexos, a coordenação pelo ponto focal e a validação institucional pela STC, incluindo prazo de cinco dias úteis com duas prorrogações e histórico auditável. Autenticação, arquivos e dados permanecem simulados no navegador; a substituição por serviços reais depende do back-end, que é o próximo passo do projeto.

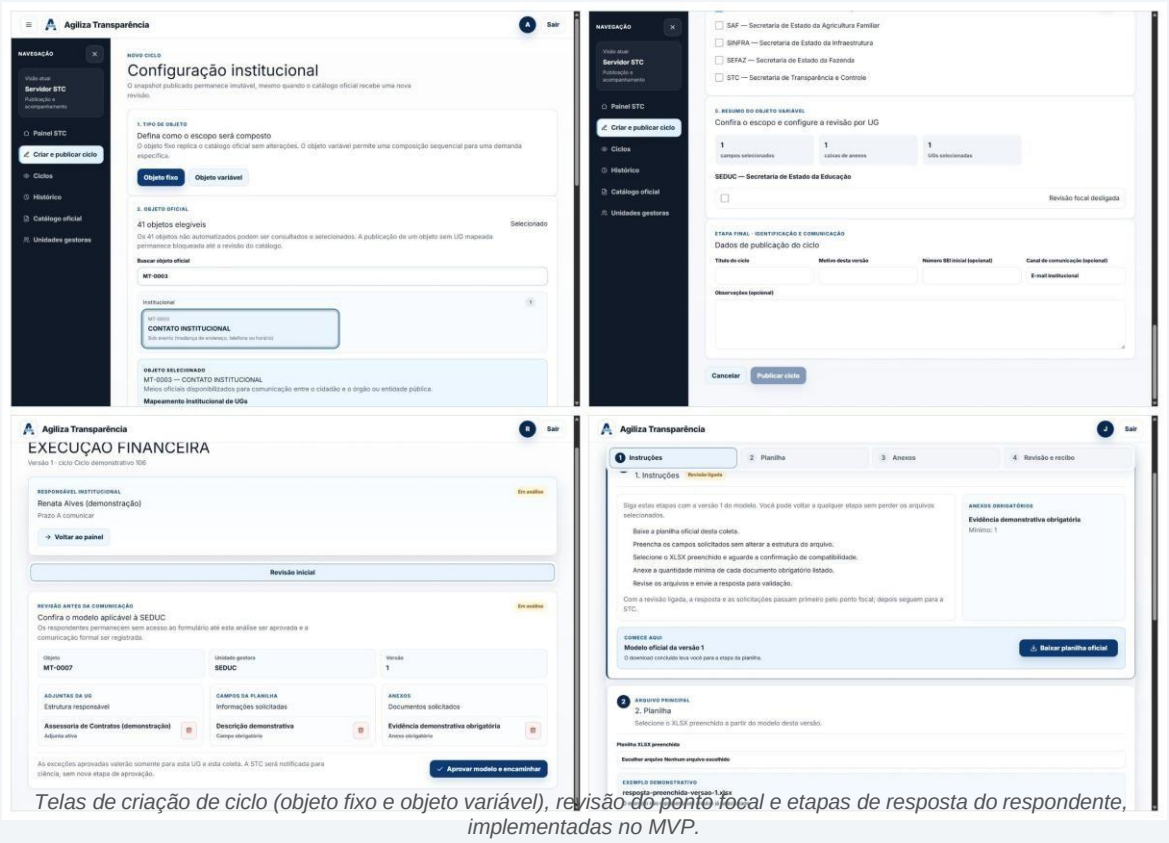

Telas de criação de ciclo (objeto fixo e objeto variável), revisão do ponto focal e etapas de resposta do respondente, implementadas no MVP.
